



Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj



**ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.
DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO**

Rovinj-Rovigno, 30. srpnja 2019.

**SVIM GRAĐANIMA
ROVINJSKOG SELA**

IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. provodi do sada najveću investiciju usmjerenu na učinkovito upravljanje sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda „**Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj**“, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 160.585.512,68 HRK, čiji su utjecaj direktno mogli osjetiti svi građani Rovinjskog Sela kroz proces izgradnje kanalizacijske mreže i crpnih stanica.

Kroz projekt se realiziralo ukupno **11.800 m** od 13.695 m glavnog kolektora i tlačnih cjevovoda. Preostali dio su dodatni ogranci koji nisu bili predviđeni za izgradnju zbog neriješenih imovinsko – pravnih odnosa. Početak izgradnje dodatnih ogranaka planira se polovicom rujna sa rokom dovršetka do kraja 2019. godine. Na svim su kolektorima izvedena revizionna okna i kućni priključci. Sve ulice u kojima su izvođeni radovi su asfaltirane, te je ukupno ugrađeno oko **50 000 m²** asfalta.

Osim radova na kanalizaciji, izvodili su se radovi na izgradnji vodovodne mreže (oko 4.300 m) čiji je investitor Istarski vodovod d.o.o. Buzet, optičke mreže (ugrađeno je oko 800 m novih instalacija, te rekonstruirano oko 2.200 m instalacija za potrebe ugradnje optičkih kabela 5-te generacije) od strane Hrvatskog telekoma d.d. Radovi su bili praćeni i izgradnjom oko 300 m novih elektro energetske kablova od strane Hrvatske elektroprivrede d.d. Postavljeno je i oko 400 m javne rasvjete.

U jednoj od glavnih ulica u Rovinjskom Selu, ulici Stjepana Žiže ugrađeno je oko **1800 m²** rubnjaka i asfaltirano oko **1100 m²** nogostupa (financirano od strane Istarskog vodovoda Buzet d.o.o, Hrvatskog Telekoma d.d. i Odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o).

Kako je i obećano u 2017. godini, Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. nastojala je ispoštovati rok završetka radova na kanalizacijskoj mreži do turističke sezone 2019. godine, iako je **Odlukom Vlade Republike Hrvatske projekt**

proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, a strateški projekti ne podliježu zabrani građevinskih radova za vrijeme turističke sezone. Unatoč tome, najveći dio radova završen je do polovice srpnja 2019. godine, dok su se manje kvadrature završile do 26. srpnja 2019. godine, što je skoro dva mjeseca prije ugovorenog roka.

Nakon dovršetka radova na asfaltiranju, slijede radovi na poboljšanju izgleda okoliša i vraćanja istog u prvobitno stanje.

Također su u tijeku i radovi **izgradnje područnog vrtića Neven**. Budući vrtić i jaslice imati će prostor za tri odgojno obrazovne skupine djece u redovitom programu i to prostorije za jednu jaslčku skupinu te prostorije za dvije vrtićke skupine, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. Zgrada će imati dva kata i ukupnu građevinsku bruto površina (GBP) 703 m².

Ukupna investicija radova te usluge nadzora i koordinatora iznose 10.163.120,52 HRK s PDV-om. Izvođač radova je Vladimir Gortan d.d. iz Pazina, a glavni projektant je Aleksandar Paris, dipl.ing.arh. iz Rovinja. Ugovoreni radovi trebali bi biti dovršeni u travnju 2020. godine.

U proteklom periodu izvedeni su i **radovi investicijskog održavanja objekata javne rasvjete** na području Rovinjskog Sela. Sanirani su i izvedeni radovi javne rasvjete u Ulicama S. Žiže-Bilice, Vičani i Radovani. Dobavljeno je i montirano 11 rasvjetnih tijela visine 6 metara – LED rasvjete. Radovi uključuju sve potrebne građevinske iskope i izrade temelja kao i potrebnu elektromontažu do kompletne funkcionalnosti sustava. Radove je izvela tvrtka Miramare d.o.o. iz Rovinja a ugovorena vrijednost iznosi 179.940,00 HRK + PDV.

U tijeku je i priprema investicije odnosno provođenja pripreme i postupka javne nabave **izgradnje dijela prometnice Stjepana Žiže** u Rovinjskom Selu. Radovima se planira izgraditi dio ulice sa dva kolna traka i nogostupom. Kolnik je ukupne širine 6.0 m a sa zapadne strane ima jednostrani nogostup širine 1,8 m. Prometnica je opremljena oborinskom kanalizacijom i javnom rasvjetom. Dužina ulice je cca 50 m.

Predmetna dionica ulice služiti će trenutno radi izgradnje i uporabe dječjeg vrtića, a koji se gradi sa istočne strane projektirane ulice. Ista se povezuje na postojeći asfaltni kolnik ulice S. Žiže u Rovinjskom Selu. Procijenjena vrijednost nabave je 656.000,00 HRK bez PDV-a.

Poštovani sugrađani,

svjesni smo da ste bili prisiljeni boriti se sa određenim poteškoćama i da je to kroz ovo razdoblje izazvalo i dozu nervoze, ali napominjemo kako su zaista gotovo sve naše ekipe neumorno radile kako bi se ovaj veliki projekt što prije završio.

Zahvaljujemo se svim radnicima na predanom radu i posvećenosti te se još jednom ispričavamo za sve neugodnosti kojima ste bili izloženi za vrijeme odvijanja radova.

S poštovanjem,

**Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.
Direktor Ognjen Pulić**



Grad Rovinj-Rovigno

Gradonačelnik Marko Paliaga




EUROPSKA UNIJA
ZAJEDNO DO BUDUĆNOSTI

EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOWI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

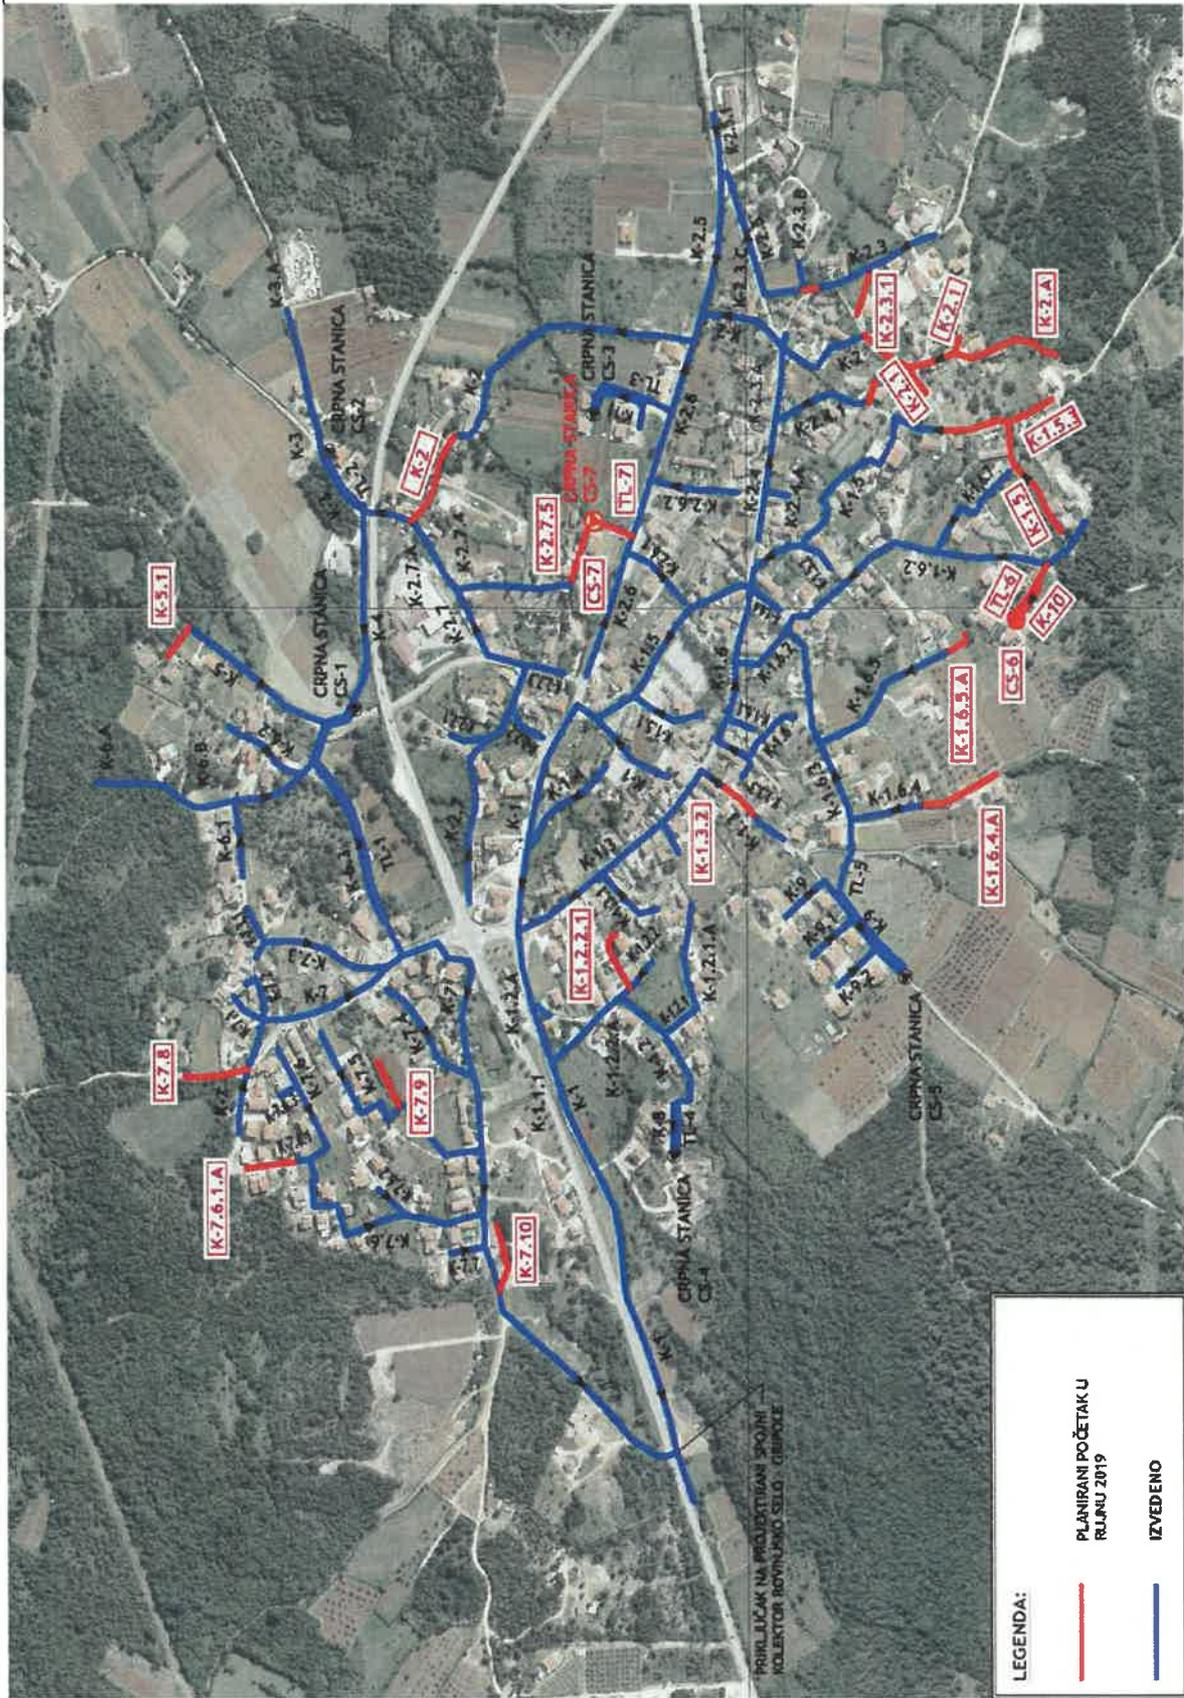

OPĆIJE ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.
DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l.
